

令和8年度一般会計補正予算(第5号:9月補正③)

■歳入歳出予算補正

現計予算額 18,936,369 千円
(その②補正後)
今回補正額 0 千円
累計予算額 18,936,369 千円

補正額の内容
(歳入)

(単位:千円)

	款名	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
1	繰入金	▲ 33,131	▲ 33,131		庁舎整備基金繰入金
2	繰越金	31		31	
3	市債	33,100	33,100		
	歳入合計	0	▲ 31	31	

(歳出)

(単位:千円)

	事業名	補正額	上段:左の財源内訳／下段:予算書説明欄			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	新庁舎整備事業費	財源更正		33,100	繰入 ▲ 33,131	31
			財源更正			

■継続費補正

変更 (単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
11 災害復旧費	3 その他公共施設・公用施設災害復旧費	新庁舎整備事業費	6,074,386	令和8年度	2,698,531	6,674,386	令和8年度	2,698,531
				令和9年度	2,872,587		令和9年度	3,238,767
				令和10年度	503,268		令和10年度	737,088

(参考) 継続費に関する調書(抄)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					
				年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
11災害復旧費	3その他公共施設・公用施設災害復旧費	新庁舎整備事業費	補正前の額		千円	千円	千円	千円	千円
				8	2,698,531		2,665,400	33,131	
				9	2,872,587	225,000	2,613,600	33,987	
				10	503,268		73,100	430,168	
				計	6,074,386	225,000	5,352,100	497,286	
			補正額		千円	千円	千円	千円	千円
				8	0		33,100	△ 33,131	31
				9	366,180	△ 225,000	625,100	△ 33,987	67
				10	233,820		663,900	△ 430,168	88
				計	600,000	△ 225,000	1,322,100	△ 497,286	186
			補正後の額		千円	千円	千円	千円	千円
				8	2,698,531		2,698,500		31
				9	3,238,767		3,238,700		67
				10	737,088		737,000		88
				計	6,674,386		6,674,200		186

件 名

新庁舎整備実施設計（最終報告）の修正について

令和8年9月1日開札の小矢部市新庁舎整備事業工事において、入札不調となったことから、入札を中止し、設計の点検及び設計価格の見直しを行った結果、令和8年6月の全員協議会で報告した新庁舎整備実施設計（最終報告）の一部を修正しましたので、次のとおり報告いたします。

1 概算事業費等について

(1) 概算事業費（サーバー移転費及びシステム導入費は除く）

中東情勢の悪化により、積算以降に著しい建設物価の上昇が見られ、特定の工種（土工、地業、型枠、免震装置等）において、公共単価と実勢単価の間に大きな乖離があることが判明したことから、設計価格の見直しを行いました。

修正実施設計（9月）	実施設計（6月）	増加額	参考：基本設計約 67.6 億円
約 77.3 億円	約 71.3 億円	6.0 億円	

（修正内訳） ア 新庁舎建設工事 約 65.4 億円 （6.0 億円の増）

イ 設計監理委託 約 1.0 億円

ウ 現庁舎解体工事 約 2.6 億円

エ 外構工事等 約 3.8 億円

オ 什器備品 約 4.3 億円

カ 雑費等 約 0.2 億円

合 計 約 77.3 億円


(2) 財源内訳

財 源	修正実施設計（9月）	実施設計（6月）	増加額
ア 地方債	約 73.0 億円	約 67.0 億円	6.0 億円
イ 庁舎整備基金	約 4.3 億円	約 4.3 億円	-
合 計	約 77.3 億円	約 71.3 億円	6.0 億円

2 事業スケジュール（予定）について

令和8年9月開札の新庁舎整備工事の入札が中止となり、再度、令和8年10月に工事入札を行うとした場合、当初予定よりも新庁舎建設の工事着工が約2か月遅れるため、事業スケジュールを次の表のとおり変更します。

(表) 事業スケジュール

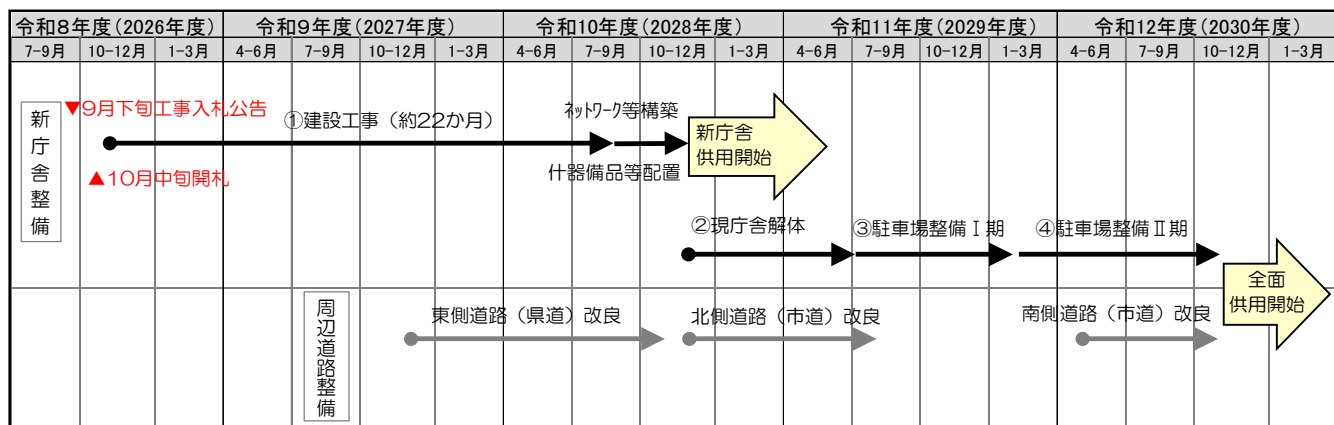

3 当面のスケジュール（予定）について

令和8年 9月下旬 新庁舎整備事業工事入札公告

令和8年10月中旬 開札

令和8年10月下旬 工事請負契約議案の提出

(新庁舎整備事業建築主体工事、機械設備工事及び電気設備工事)

4 実施設計（概要版）について

別紙のとおり
